


CRONOPROGRAMMA CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E SPOGLIATOI PREFABBRICATI
Comune di Dueville (VI)

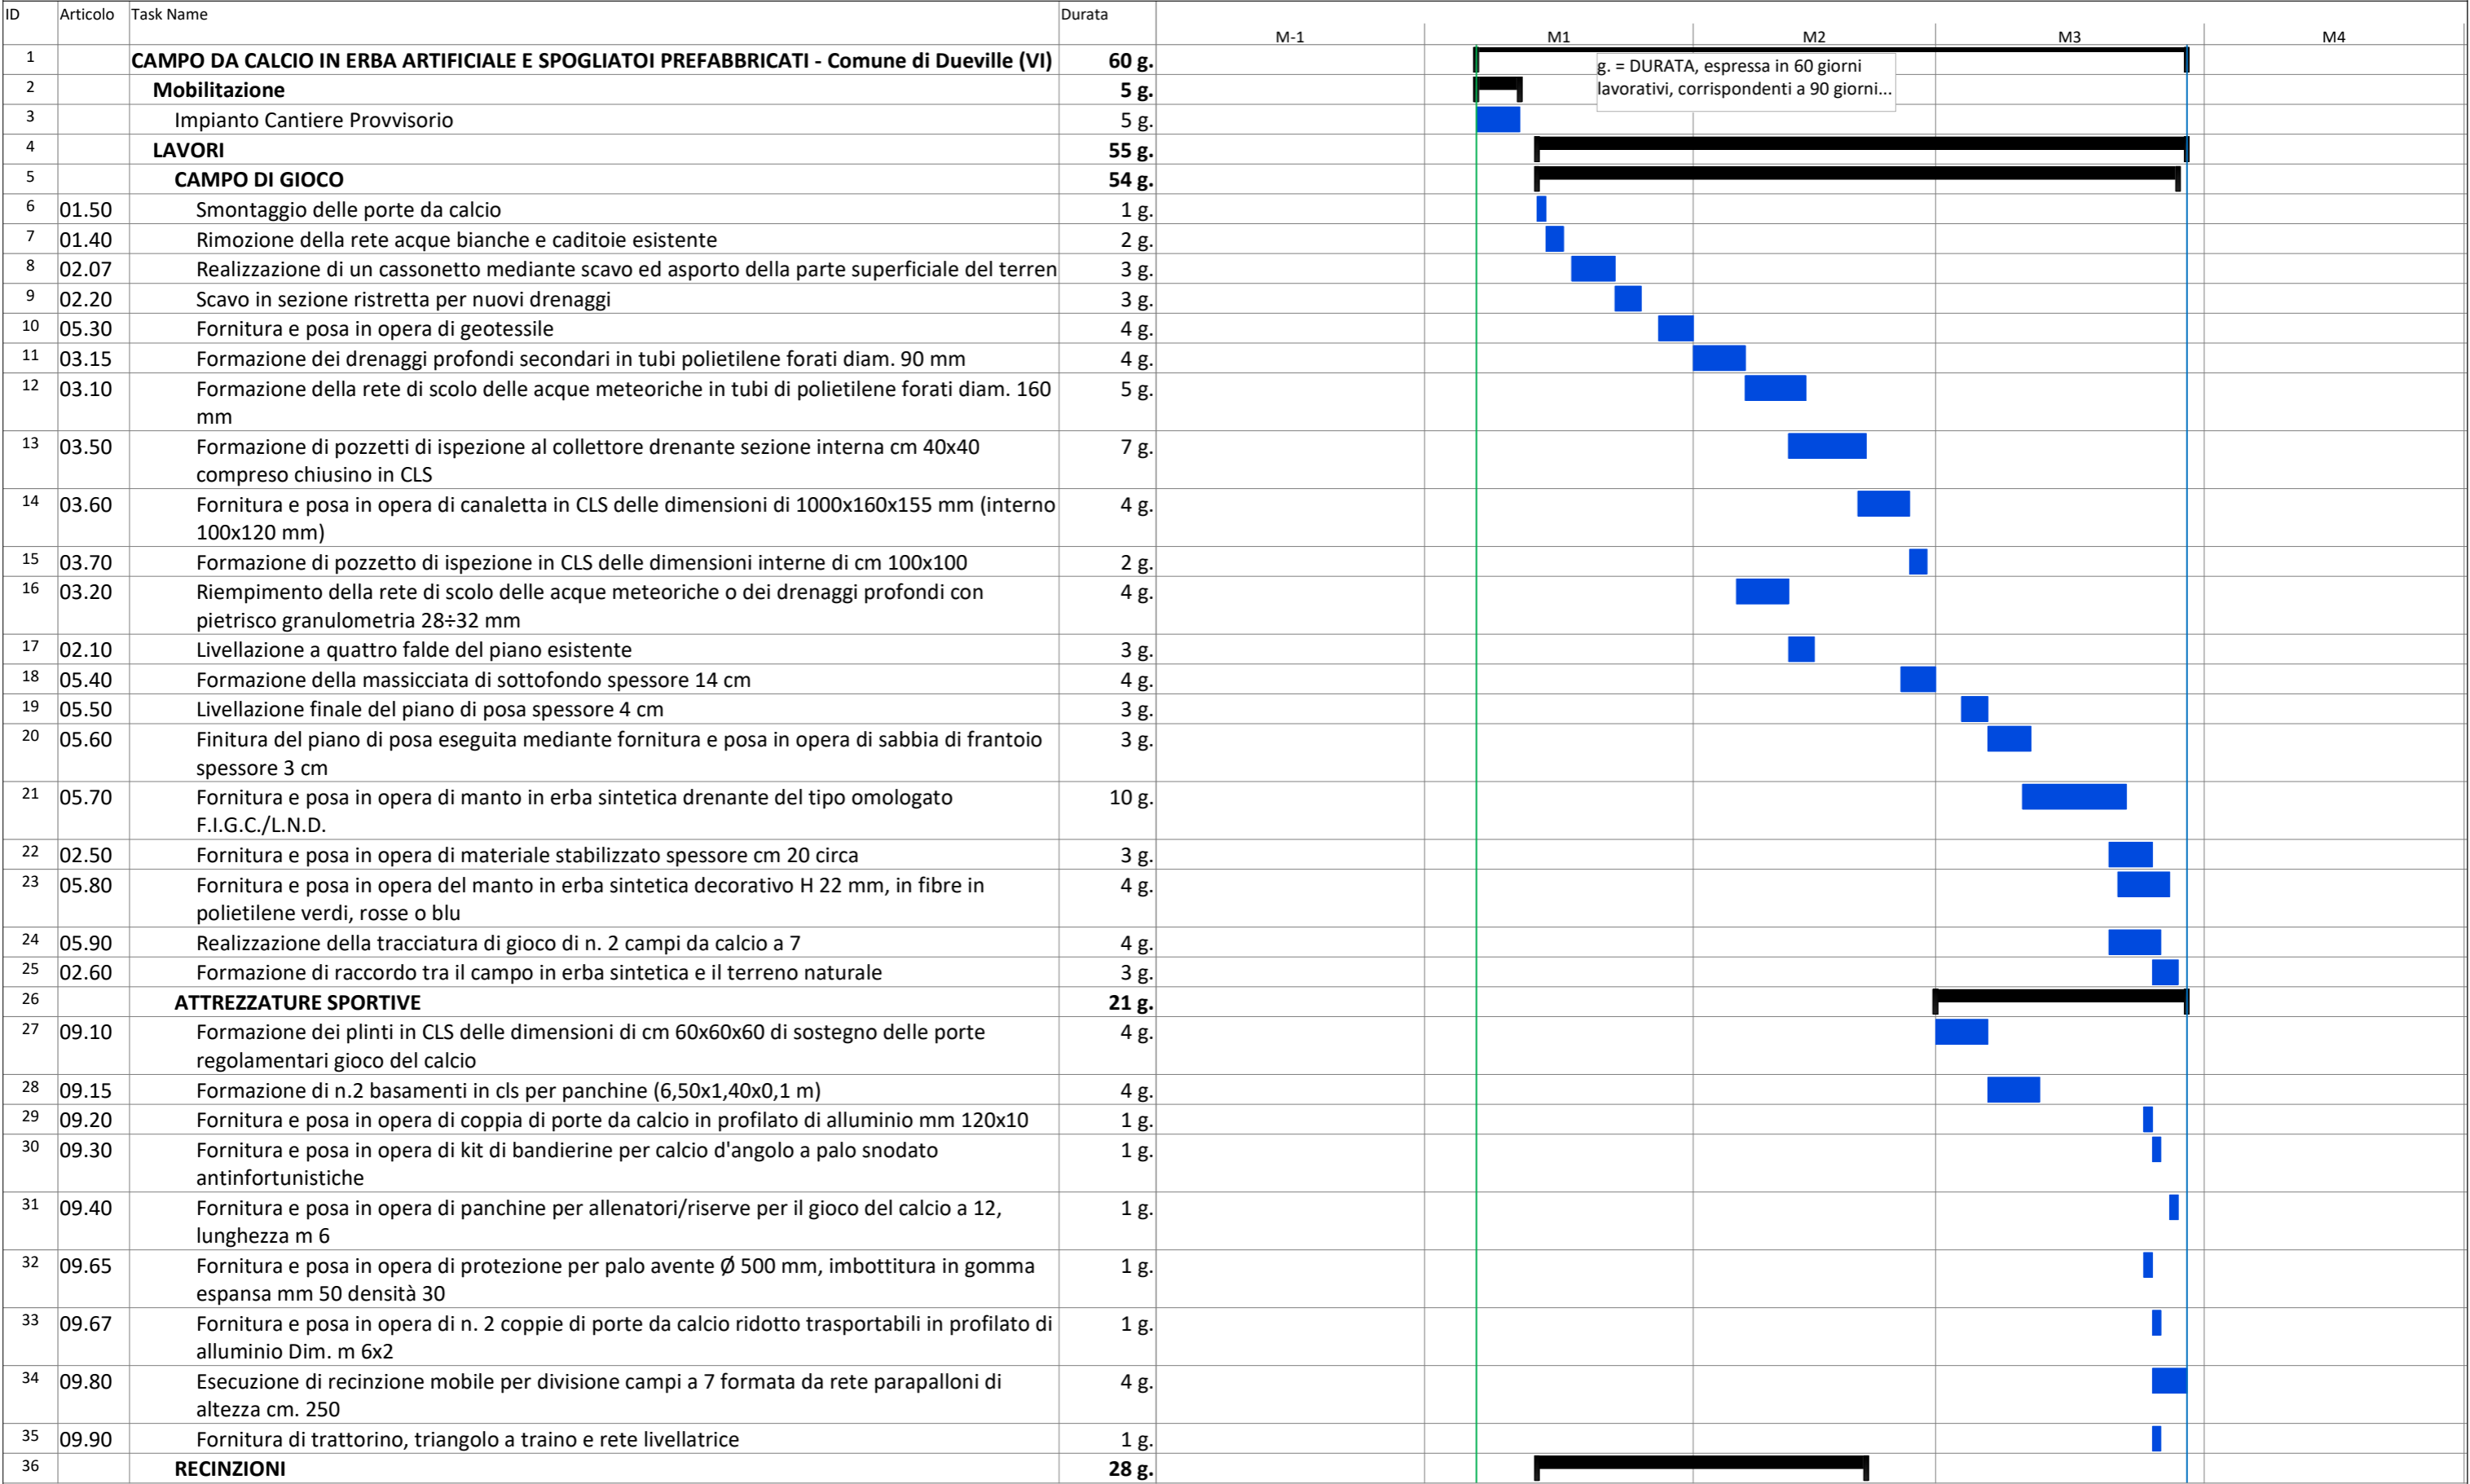

CRONOPROGRAMMA CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E SPOGLIATOI PREFABBRICATI
Comune di Dueville (VI)

ID	Articolo	Task Name	Durata	M-1	M1	M2	M3	M4
37	01.15	Taglio e rimozione della siepe di recinzione	3 g.					
38	01.30	Smontaggio della rete metallica esistente	1 g.					
39	10.10	Formazione di recinzione H 2,00 m costituita rete zincata/plastificata, montanti e saette in acciaio zincato a caldo	5 g.					
40	01.35	Rimozione della rete in nylon esistente e fornitura+posa in opera da 2,00 a 6,00 m di nuova rete in nylon maglia13x13cm	4 g.					
41	10.45	Fornitura e posa in opera di nuova rete in nylon maglia13x13cm e altezza 6,00 m	3 g.					
42	10.20	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con passaggio netto di cm 150x200 in tubolari in acciaio zincato	7 g.					
43	10.25	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale con passaggio netto di cm 150x200 in tubolari in acciaio zincato	7 g.					
44	10.30	Fornitura e posa in opera di cancello passaggio netto dimensioni cm 200x200 in elementi di tubolare zincato	5 g.					
45		OPERE DI COMPLETAMENTO	7 g.					
46	02.08	Realizzazione di pavimentazione ingresso carraio esterna alla recinzione	6 g.					
47	11.30	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso fino a cm 5,00 di spessore	1 g.					
48	11.32	Sovraprezzo al taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm oltre i cm 5,00	1 g.					
49	02.09	Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso	1 g.					
50		IMPIANTO DI IRRORAZIONE	12 g.					
51	06.10	Intervento di rifacimento delle tubazioni interrate	8 g.					
52	06.50	Fornitura e posa in opera di vasca in polietilene lineare ad alta densità da interro per accumulo acqua capacità 15 mc	4 g.					
53		IMPIANTO ELETTRICO	5 g.					
54	08.20	Impianto Elettrico per Campo da Calcio in Erba Sintetica con Spogliatoi	5 g.					
55		BLOCCO SPOGLIATOI E SERVIZI	26 g.					
56	02.05	Scavo di sbancamento	3 g.					
57	03.32	FornituraFornitura e Posa Tubi in PVC-U Rigido diam. 110 mm	2 g.					
58	11.07	Calcestruzzo dosaggio C 25/30 per Fondazioni a Platea	6 g.					
59	03.35	Tubi in Polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per distribuzione acqua potabile diam. 40 m	2 g.					
60	03.75.A	Pozzetto con fondo più chiusoino, altezza cm 55 circa	3 g.					
61	03.75.B	Pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chousino, altezza cm 105 circa	2 g.					
62	11.80	Fornitura e posa in opera su platea predisposta di blocco spogliatoio prefabbricato	10 g.					
63	11.85	Fornitura e posa in opera su platea predisposta di Box Magazzino prefabbricato	2 g.					
64		Smobilitazione	3 g.					
65		Spianto Cantiere Provvisorio	3 g.					

"N.B.: Sono escluse dalla durata dei lavori le eventuali sospensioni dovute ai sopralluoghi dei tecnici della Lega Nazionale Dilettanti, atti all'ottenimento dell'omologazione del campo in erba artificiale."
