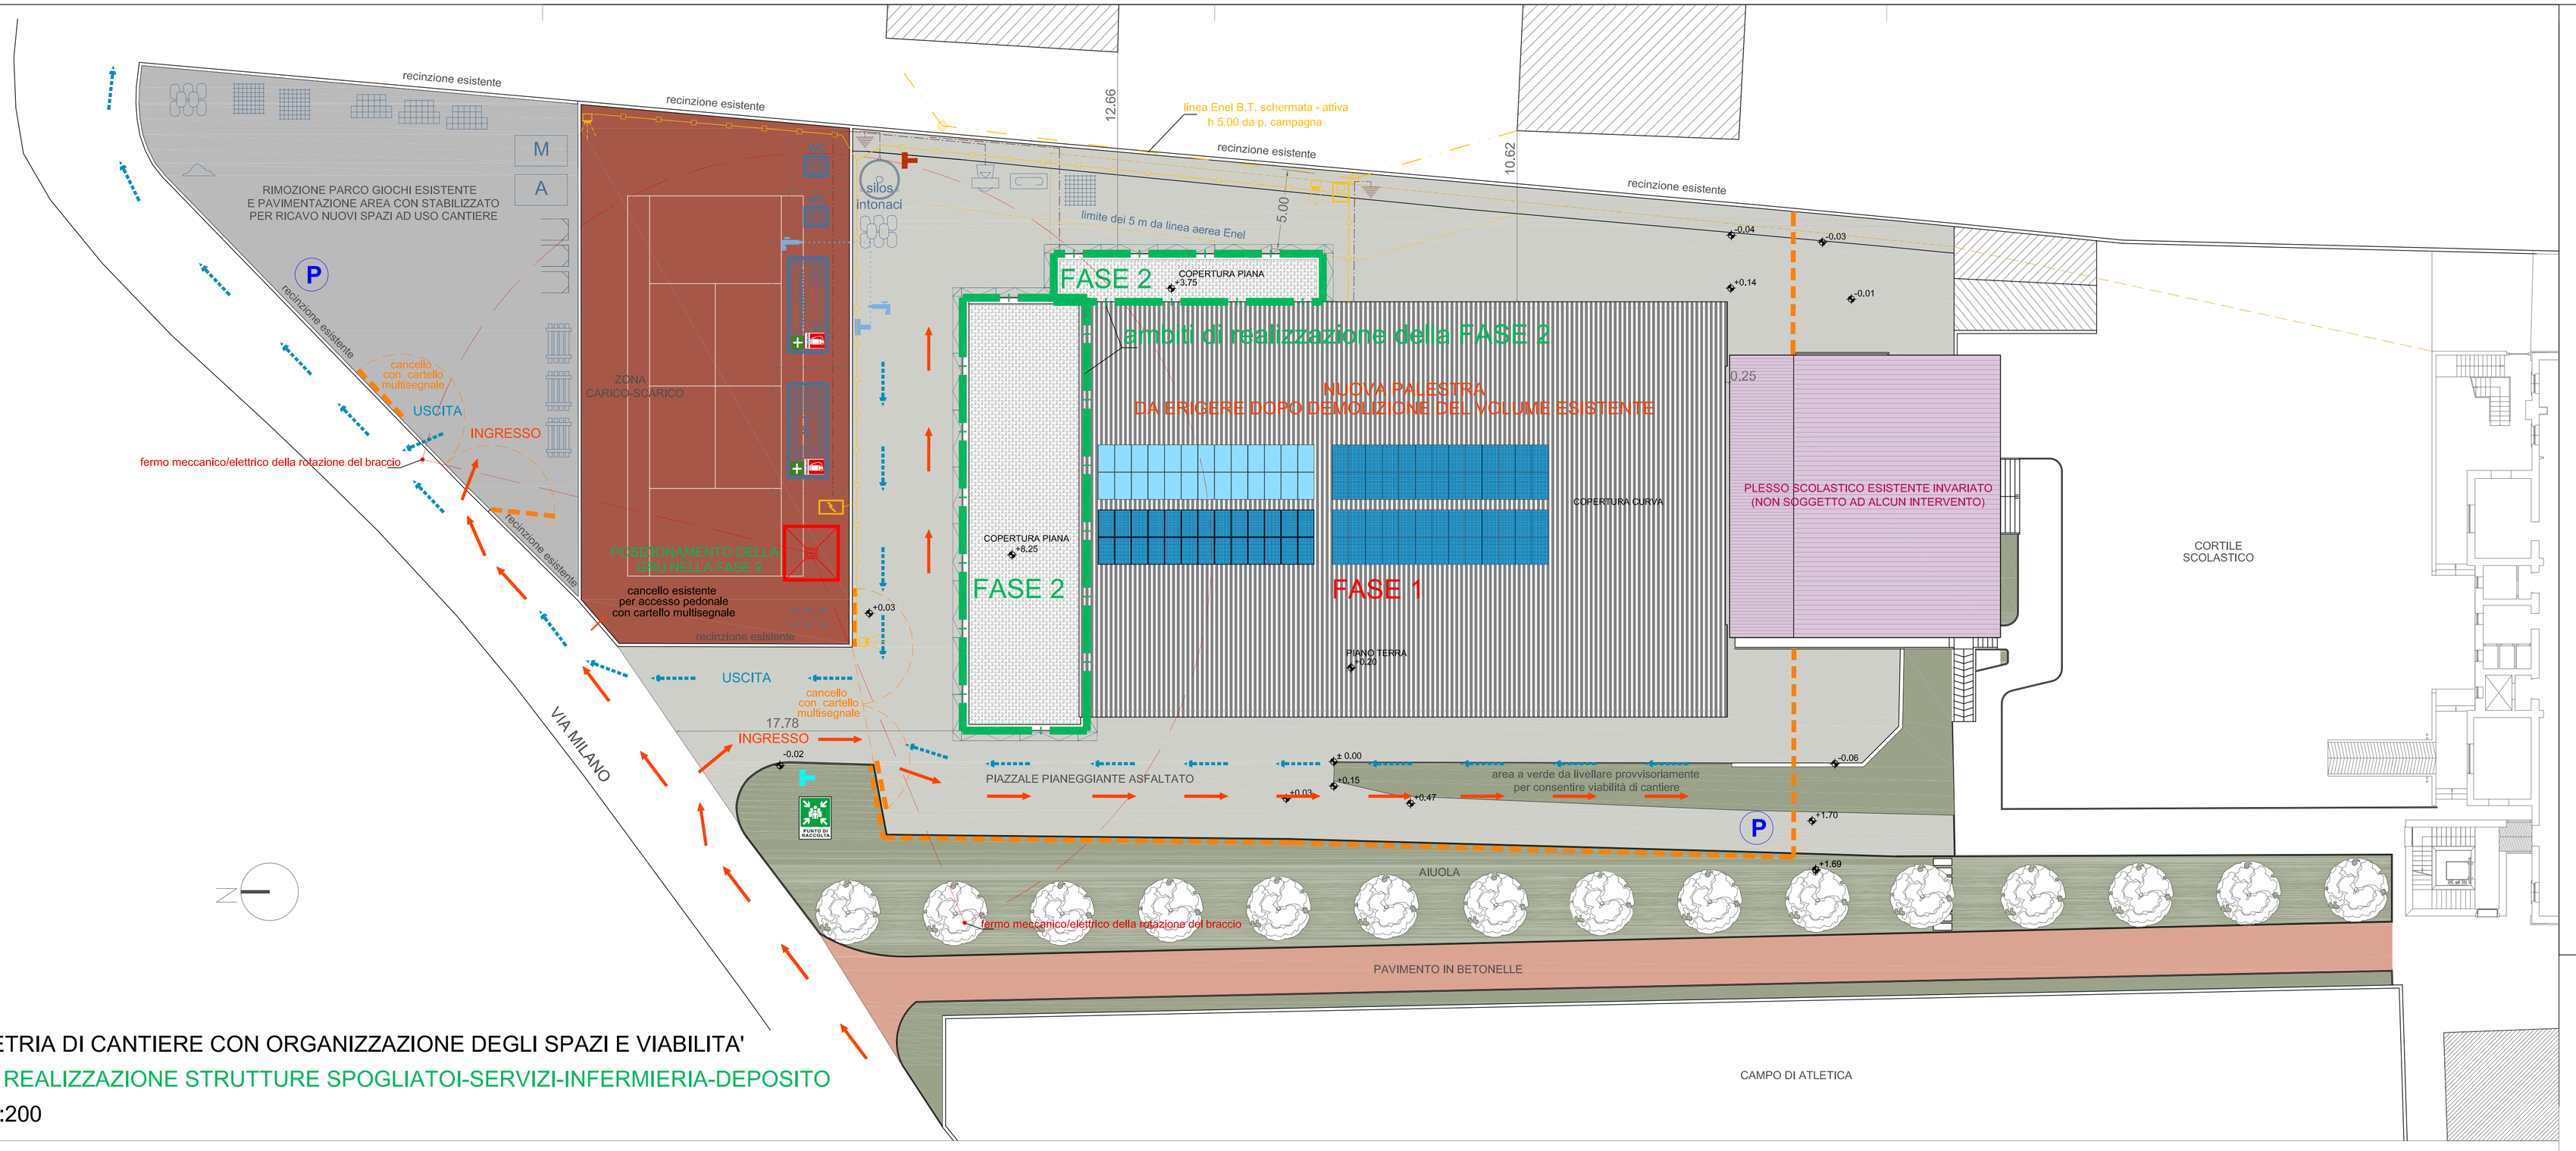

PLANIMETRIA DI CANTIERE CON ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VIABILITA'

FASE 2 - REALIZZAZIONE STRUTTURE SPOGLIATOI-SERVIZI-INFERMIERIA-DEPOSITO

SCALA 1:200

LEGENDA					
NUOVA RECINZIONE	BARACCAMENTI	STOCCAGGIO SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI	LINEA GAS-METANO DI RETE interrata
PARCHEGGIO	BAGNI CHIMICI	STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI	LINEA ELETTRICA AEREA B.T. schermata
PERCORSO MEZZI IN INGRESSO	DEPOSITO PONTEGGI	BETONIERA	NUOVA LINEA ELETTRICA DI CANTIERE
PERCORSO MEZZI IN USCITA	DEPOSITO CASSEFORMI	BANCO FERRAIOLI	ALLACCIO RETE ELETTRICA
PONTEGGIO METALLICO	DEPOSITO MACCHINARI	PUNTO DI RACCOLTA IN CASO DI EMERGENZE	NUOVO QUADRO CANTIERE PRINCIPALE
RECINZIONE/PARAPETTO DI PROTEZIONE	DEPOSITO ATTREZZATURE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	LINEA E DISPERSORI DI TERRA (CU >35 mmq)
PLESSO SCOLASTICO esterno al cantiere	DEPOSITO D.P.I.	ALLACCIO ACQUE NERE DI PROGETTO	LINEA IDRICA
	STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA	ALLACCIO ACQUE BIANCHE DI PROGETTO	UTILIZZATORI LINEA IDRICA
	STOCCAGGIO LATERIZI, SOLAI PIGNATTE	LINEA AEREA TELECOM esistente - ATTIVA (eliminata)	ALLACCIO ACQUEDOTTO
	FASE 1 CANTIERE : CORPO CENTRALE PALESTRA	FASE 2 CANTIERE : CORPI ACCESSORI PALESTRA	STOCCAGGIO BOMOLE DI GAS PROPANO

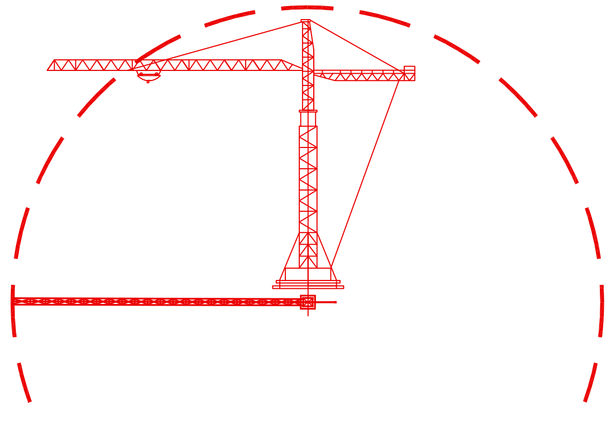

Mezzi di sollevamento : GRU automontante braccio min. 25m / h min. 18m da installare nella FASE 2 nell'area ex campo da tennis, impiegata per la realizzazione dei getti delle strutture in cls in opera di fondazioni e pilastri e posa delle lastre dei solai in predalles

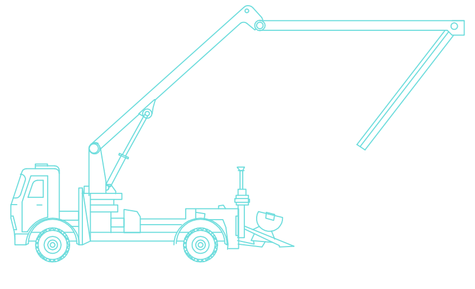

Mezzi di fornitura cls : pompa carrata per getti in altezza



Mezzi di fornitura cls : autobenoniera

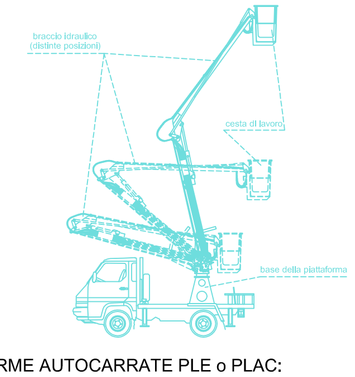

PIATTAFORME AUTOCARRATE PLE o PLAC:
certificate dal produttore per lo sbarco in quota, da impiegare per l'accesso in copertura

CARTELLO MULTISEGNALE IN INGRESSO

CASSETTA PRIMO SOCCORSO

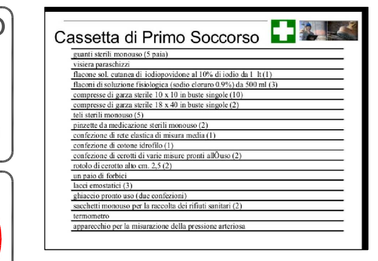

GESTIONE BOMBOLE GAS PROPANO

Le bombole sono di grandi dimensioni, pesanti e relativamente instabili a causa del ridotto diametro della base rispetto all'altezza. Ai fini della sicurezza è importante rispettare le seguenti regole per lo stoccaggio delle bombole di gas-propano:

STOCCAGGIO DELLE BOMBOLE IN MODO APPROPRIATO
Stoccare le bombole in posizione verticale e fissarle saldamente una tettoia o una parete in modo che siano ben ancorate all'orizzontale su una superficie piana, ben ancorata e all'ombra (ad. es. dentro una gabbia metallica coperta con pannello sandwitch). In posizione verticale e fissata per evitare che cadano.
Le bombole piene e vuote vanno separate. Organizzare le proprie scorte di bombole in modo che vengano utilizzate prima le bombole meno recenti.
Separare le bombole in base alla proprietà dei gas utilizzati in cantiere (infiammabili, inerti, ossidanti, ecc.). Le bombole con contenuto infiammabile devono essere stoccate separatamente dalle altre bombole.
Le bombole piene e vuote di gas infiammabili devono essere posizionate nelle aree di stoccaggio in conformità ai requisiti di legge applicabili.
Si prescrive di stoccare fino a 75 kg di bombole contenenti gas propano contemporaneamente. (limite massimo per non assoggettare il cantiere alla verifica dei VV.F.)

Le proprietà dei singoli gas.
I gas criogenici, liquefatti e compressi che sono più pesanti dell'aria possono accumularsi in aree a livelli bassi, quali tubi di drenaggio, cunicoli, seminterrati e fosse. Tenere in considerazione gli aspetti menzionati per lo stoccaggio di questi gas.
I componenti elettrici nell'area di stoccaggio. Per lo stoccaggio dei gas infiammabili gli impianti e gli apparecchi elettrici deve assolutare specifiche particolari.

N.B.
Non stoccare mai le bombole infiammabili insieme ad altri tipi di bombole di gas. Non stoccare altri prodotti insieme alle bombole. In particolare i materiali infiammabili quali carburanti, oli, vernici o liquidi corrosivi poiché si possono creare situazioni pericolose. Non stoccare le bombole di gas liquido (GPL) mai a meno di cinque metri da altre bombole di gas. La distanza può essere ridotta se le bombole sono separate da una parete tagliafuoco.

BARACCAMENTO DI CANTIERE (TIPO)



WC CHIMICO (TIPO)



Regione del Veneto
Provincia di Vicenza
Comune di Monte di Malo

RISTRUTTURAZIONE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista generale:	Gruppo di lavoro:	Il progettista della sicurezza:	Il RUP:
ing. Lorenzo Righele (firmato digitalmente)	Ing. Lorenzo Righele Ing. Elisa Cocco Arch. G.M. Chemello Geom. Maurizio Canzian Geom. Martina Dell'Orto Geom. Christian Fontana Geom. Daniel Buffa	geom. Daniel Buffa (firmato digitalmente)	geom. Paolo Rossato (firmato digitalmente)

TITOLO ELABORATO:
PLANIMETRIA DI CANTIERE - Allegato 1.B al PSC

REVISIONE:	SCALA:	DATA:	
n° ____ del ____ n° ____ del ____ n° ____ del ____ n° ____ del ____	1:200	28/02/2019 FILE:	
	ELABORATO: geom. Daniel Buffa	VERIFICATO: geom. Daniel Buffa	APPROVATO: Ing. Lorenzo Righele
	2019/031	282-H-ARC-TAV06.2.1	
